

青岛九邮信息技术有限公司

技术研发规范

编制	吴洪伟	审核	吴克	审批	孙元朝
发布日期		2019 年 1 月 1 日			

发布、修订记录

[illegible]

目 录

1. 概述.....	1
2. 研发组织.....	1
2.1. 决策团队.....	1
2.2. 研发团队.....	1
3. 研发流程.....	1
3.1. 年度技术研发规划.....	1
3.2. 开发流程.....	2
4. 各阶段规范.....	2
4.1. 立项阶段.....	2
4.2. 需求阶段.....	2
4.3. 设计阶段.....	2
4.4. 实现阶段.....	3
4.5. 测试阶段.....	3
4.6. 结项发布.....	3
4.7. 验收.....	3
5. 全流程规范.....	4
5.1. 项目变更及重估约定.....	4
5.2. 经费控制.....	4
5.3. 研发、测试环境管理.....	5

1. 概述

此文档旨在建立青岛九邮信息技术有限公司（下文简称“青岛九邮公司”）的运维技术研发管理流程，为技术研发相关团队提供研发过程指导，从而提升公司运维技术研发质量和成功率。

此文档所描述的技术研发需依据市场目标和业务目标，覆盖服务产品开发、改善服务管理工具、发现问题的技术和解决问题的技术等方面。

2. 研发组织

结合公司的实际情况，公司的技术研发管理可以分成决策团队和开发团队两个部分。以下将对这两个团队做专门的介绍。

2.1. 决策团队

决策团队，主要由公司领导、各部门领导负责人组成。有两个主要职责：其一、在年初制定公司的技术研发发展战略，制定公司的年度技术研发规划；其二、根据实际情况对年度技术研发规划进行修正，以及对一些不在规划之内的研发做出决策。

2.2. 研发团队

研发团队主要由质量管理部、运维管理部、开发部组成。它的主要职责是实施公司的技术研发。

在研发团队中项目经理对整个产品负责。根据实际情况，一个技术研发团队典型的人员配置如下：

角色	必须	职责
项目经理	是	- 对整个研发项目负责 - 负责研发团队的管理
需求人员	否	主要负责协助项目经理进行需求分析和调研
研发人员	是	负责研发项目的实现
测试人员	是	负责研发项目的测试
日常维护	否	


3. 研发流程

3.1. 年度技术研发规划

年度技术研发规划是指每年初，根据市场目标、业务目标、客户、竞

争对手等各方面的分析和调研对新一年技术研发所做出的决定。在每年初可由研发团队提出需求研发清单，也可由决策团队直接给出。最终由决策团队对候选技术研发项目清单进行评审，确定本年度需要研发的技术并最终生成《重点项目研发实施计划》。

3.2. 开发流程

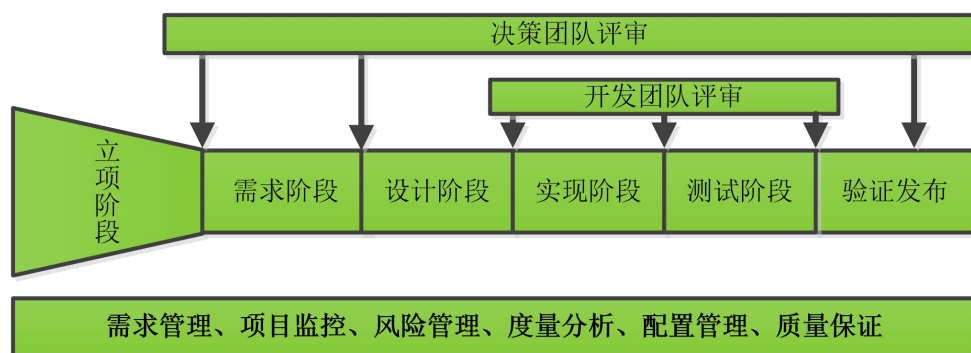

如上所示，公司级研发项目分成立项、需求、设计、实现、测试、验证发布六个阶段。以下将针对各个阶段进行详细的介绍。

4. 各阶段规范

4.1. 立项阶段

立项阶段是研发的开始阶段，此阶段的主要工作是发现项目，对项目进行可行性分析并对项目是否启动做出决策。主要活动包括：

- 1) 通过市场、业务分析，客户调研发现项目
- 2) 提交申请，决策团队批准
- 3) 确定项目的项目经理

4.2. 需求阶段

需求阶段主要项目的是完成项目需求调研、项目初期的技术探索及初步制定项目计划。主要活动包括：

- 1) 需求人员进行需求开发，编写《项目需求说明书》并提交评审
- 2) 项目经理对项目进行初步估算，编写《重点项目研发实施计划》并提交决策团

4.3. 设计阶段

设计阶段主要需要完成系统设计工作。主要活动包括：

- 1) 研发人员依据《项目需求说明书》、《重点项目研发实施计划》，如涉及开发程序将依据《系统设计说明书》并提交评审
- 2) 项目经理对《重点项目研发实施计划》进行细化和调整
- 3) 项目经理对《项目需求说明书》进行细化和调整

4.4. 实现阶段

此阶段主要完成系统的实现、代码评审、测试的工作，主要活动包括：

- 1) 研发人员根据前期文档对程序进行编码
- 2) 研发人员对程序进行集成测试
- 3) 测试人员对程序进行初步确认测试，提交发现的缺陷
- 4) 研发人员对 BUG 进行修复，测试
- 5) 项目组对相关研发文档进行完善
- 6) 项目经理对《项目需求说明书》进行细化和完善
- 7) 项目经理对《重点项目研发实施计划》进行完善

4.5. 测试阶段

测试阶段主要对产品进行确认测试。主要活动包括：

- 1) 需求人员对功能进行确认测试，完成后编写《测试报告》
- 2) 研发人员对测试过程中的 BUG 进行修复
- 3) 项目经理对程序进行验证

4.6. 结项发布

发布阶段是研发的最后一个阶段，完成此阶段产出物将提交给公司。主要活动包括：

- 1) 相关人员编写《系统用户手册》，对产品进行试点
- 2) 对测试过程中发现的问题进行分析、总结，修复必要的问题
- 3) 测试工程师对修复的问题进行测试
- 4) 测试通过后，进行产品发布并完成。

4.7. 验收

目前公司的技术研发项目主要包括两种，一种是客户委托研发的项目；另外一种是公司内部决策需要研发的项目，暂时没有客户。对于这两种项目，验收的

方式分别为：

- 1) 客户委托开发的项目，需要客户在《验收报告》上签字。
- 2) 内部研发的项目，在项目完成后通过项目结项会议来进行项目的内部验收，并由需求部门领导在《测试报告》或《验收报告》上签字。

5. 全流程规范

在各阶段规范中主要描述了产品研发的各个阶段所对应的规范，但除了阶段性规划外，还有部分研发运行规范将会贯串产品研发整个过程或多个阶段，以下将对这些过程进行更详细的说明。

5.1. 项目变更及重估约定

在项目初期及需求阶段、设计阶段、实现阶段结束后，需对项目进行重新的估算。

5.2. 经费控制

(1) 研发费用管理原则

- 计划统筹安排原则；
- 节约使用，讲求经济效益原则。

(2) 职责分工

- 公司财务部负责研发费用的审批和报销，并随时监督费用的使用情况；
- 项目经理负责研发费用的预算与使用控制。

(3) 研发费用的使用管理

- 专款专用

研发费用由公司按研发计划下达到具体项目，实行专款专用，严格管理，不得挪作他用。

- 研发费用的拨付

研发费用的拨付按照公司资金拨付的规定执行，研发人员按规定的使用范围严格控制、合理使用。

- 研发合同签订

研发有关内容需要与外单位合作或委托其进行的，必须签订项目对外

委托技术合作研究合同，该合同需由公司财务部审查生效后才能拨款。

- 费用使用审批

应明确研发费用的开支范围和标准，严格执行审批程序，设立台帐归总核算研发费用。

- 研发费用报销

研发费用在报销时，须有项目相关负责人、项目部经理审核，并在核销票据上签字后方可到财务部核销。

- 核对费用使用

已发生的研发费用要及时填入也月报，财务部每两个月核对一次费用支出明细。

- 费用使用审查

公司将组织适时审查研发费用的使用情况，如发现费用使用不当，将追究相关人员的责任，或是具体情况收回已计划安排的投资款项。

5.3. 研发、测试环境管理

研发项目组应对研发环境进行管理，并在研发文档中说明技术研发的所采用的各种工具，开发环境，测试环境等。同时，研发过程应符合以下规范：

- 项目组应保证开发、测试和生产环境独立；
- 为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。
- 对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。
- 对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。
- 对研发环境和研发产出物进行配置管理。
