

青岛九邮信息技术有限公司

运维项目管理制度

编制	唐旭	审核	吴克	审批	孙元朝
发布日期	2019 年 1 月 1 日				

发布、修订记录

[illegible]

目 录

1.	文档说明.....	1
1.1	总则.....	1
1.2	使用范围.....	1
1.3	文档范围.....	1
1.4	文档依据.....	1
1.5	职责.....	1
1.6	参考文档.....	2
2.	运维项目管理流程.....	6
3.	项目管理工作规范.....	3
3.1	项目启动阶段.....	3
3.1.1	项目承接.....	3
3.1.2	签订合同.....	4
3.1.3	项目启动.....	4
3.1.4	项目计划.....	7
3.2	项目实施阶段.....	9
3.2.1	非故障、非巡检.....	14
3.2.2	驻场管理.....	11
3.2.3	应急处理.....	11
3.2.4	阶段及年度总结.....	12
3.2.5	客户档案管理.....	12
3.2.6	项目管理活动实施及项目执行管控.....	13
3.2.7	项目变更管理.....	14
3.3	项目结项阶段.....	15
3.3.1	验收条件.....	16
3.3.2	验收内容.....	17
3.3.3	验收人员.....	18
3.3.4	相关验收文档.....	18

1. 文档说明

1.1 总则

本文档主要用于加强对公司运维项目的统一管理，对项目的 PDCA 等相关事宜进行规范，指导相关人员对运维项目从立项、启动、制定实施计划、实施、管控和项目验收等过程进行全生命周期的管理。特制定本管理办法。

1.2 使用范围

公司所有运维管理部部门及相关干系人。

1.3 文档范围

本文档用于对公司运维项目的管理工作。其中验收文档内容只包括合同中所要求的在项目维护过程中必须实现的各项要求及相关文档。

1.4 文档依据

本文档按照运维服务合同，制定项目立项、启动、制定实施计划、实施、管控和项目验收的相关制度和内容。

1.5 职责

运维管理部：

- 1) 负责运维合同执行，包括合同签订（含 SLA）、合同范围（在服务目录内）及合同条款的管理，负责与客户就服务内容和 SLA 进行沟通，并将意见向运维管理部反馈；
- 2) 负责建立、实施和保持公司的运维项目管理工作，负责对运维项目的实施、管理、监控等；
- 3) 对运维服务项目的质量负责。

技术部：负责运维项目各项目工具软件、脚本的开发完善，为运维管理部对项目实施和执行涉及到的重点技术难点提供技术协助和帮助。

服务台：


- 1) 负责对运维项目的质量检查、监督与考核。在项目提交外部验收前，首先进行自检。
- 2) 负责调查客户满意度、分析与核算客户满意度，向公司领导反馈客户申诉问题，跟进项目中问题处理情况。
- 3) 对项目相关的第三方供应商进行管理。

人力资源部：负责建立与运维项目相关的绩效考核体系，定期开展对运维服务工作的绩效考评。

1.6 参考文档

- 1) 运维服务合同。
- 2) ITSS 技术运维服务标准体系相关服务过程管理文件。

2、运维服务项目管理流程

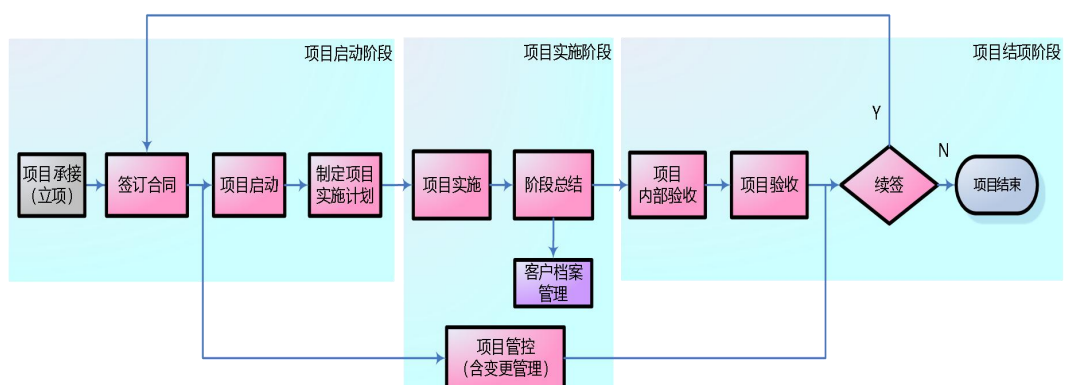

3 项目管理工作规范

3.1 项目启动阶段

3.1.1 项目承接

责任主体：运维管理部

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	时限要求	操作规范	参考标准或模板
1	资源评估	所有项目	收到项目相关信息后 2 个工作日内	1、 与市场中心确认当前部门可交付的服务内容和 SLA。 2、进行资源评估	项目合同
2	项目立项	所有项目	完成资源评估后 2 个工作日内	1、 若资源评估可行，确定承接项目 2、进行项目立项流程	项目立项报告

说明：这个阶段处理的结果是：不同类别的项目被分配到不同的责任岗位，对于外包项目，明确了项目经理，传递了项目交付文档。

3.1.2 签订合同

责任主体：运维管理部

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	时限要求	操作规范	参考标准或模板
1	签订与甲方的合同	所有项目	/	1、根据项目承接（立项）阶段，与运维管理部的沟通订立的原则，签订包含服务内容以及 SLA 的服务销售合同	项目销售合同

3.1.3 项目启动

责任主体：运维管理部

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	时限要求	操作规范	参考标准或模板
1	确认项目交付信息	所有项目	收到项目交付信息后 2 个工作日内	1、再次确认服务内容和 SLA 1) 是否存在高标低交（比较合同 SLA 和交付 SLA 定义）； 2) 是否承诺除故障处理和巡检外的增值服务	项目交付文件（项目合同文件、项

				3) 是否有特别的要求, 比如现场备件要求等 4) 是否有成熟度外产品交付 5) 设备保修时间与合同保修时间的一致性检查, 如无详细设备清单需在第一次巡检后与客户确定每台设备序列号及保修时间。 6) 确认特别说明部分 2、确认交付成本 1) 是否有与服务内容和要求相对应的交付成本; 2) 确认交付外服务客户需求的处理办法, 比如销售购买单次, 或预先购买预留人天。 3、是否分区域执行, 确定各区域项目经理 4、针对交付信息有问题的及时反馈, 由运维管理部协调售前、销售沟通	目需求、项目计划书等)
2	核实单次入项目清单 (如有)	所有项目	收到项目交付信息后 5 工作	1、核对单次入项目数据, 对于与所交付项目设备清单和服务内容不相符的单次申请筛选列表, 反馈给总经办, 由总经办与运维管理部沟通。	

			日内		
3	远程启动（若需）	外地项目	收到项目交付信息后 7 天内	向客户发出项目启动函和项目实施指导文件，并电话沟通。 （对于本地项目可选择现场启动，以便与客户充分沟通）	项目启动函 项目实施指导文件
4	内部启动会	所有项目	收到项目交付信息后 5 天内	运维管理部（若需）一起讨论项目执行策略 1. 指派项目经理 2. 运维管理部介绍项目和客户背景，包括谈判中一些关键细节等内容 3. 明确高标低交偏差内容及执行标准（偏差部份的处理流程或解决办法） 4. 项目中特殊情况问题说明 5. 如有指定分包需说明具体分包要求 6. 客户组织结构，客户系统，客户关系等说明	启动会纪要模板
5	客户现场启动会	重点项目或战略性项目【定义重	收到项目交付信息后 15 天内	1. 在充分准备的基础上与运维管理部、运维研发部（若需）一起到用户现场召开项目启动会 2. 拟定《启动会 PPT》 3. 邮件发出会议通知，附上 PPT 文件 4. 与客户确认服务范围、内容、服务标准、服务流程（故障响应流程、	外部启动会 PPT 模板 启动会纪

		点项目或战略性项目】		变更流程、满意度调查流程)、实施计划、双方项目团队成员信息 5. 发出外部启动会会议纪要 6. 更新《项目计划书》，正式发文	要模板 项目计划书模板
--	--	------------	--	--	--------------------

3.1.4 项目计划

责任主体：质量管理部

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	时限要求	操作规范	参考标准或模板
	梳理项目服务内容和范围	所有项目	收到项目交付信息后 5 天内	根据合同、SOW 等文件梳理项目服务内容和范围； 列出合同和 SOW 中可能引起歧义的内容 与客户、销售逐步核对澄清，明确偏差部份的处理流程或解决办法	项目执行计划模板

	设备清单梳理	所有项目	收到项目交付信息后 7 天内	参见合同清单，理清分包设备清单和自有服务设备清单 在 ITSM 工具（若需）上录入本次项目数据，包括配置管理数据库数据。	配置管理数据库
	服务评分标准（若需）	根据服务评分付款项目		了解客户对项目的服务质量如何考核和评分，便于控制综合评分。	项目计划模板
	项目实施计划	所有项目	收到项目交付信息后 15 天内	制定的人力资源计划和备件计划，对其可行性进行评估； 制定非故障、非巡检类服务内容的实施计划 在对项目了解和充分沟通的基础上，识别项目风险，制定应对计划； 制定项目沟通计划 获得和审定备件计划及落实情况 获得和了解技术资源计划 制定项目文档交付计划 制定项目应急预案	项目实施计划模板

	分包合同签订流程启动	部分指定项目	收到项目交付信息后 20 天内	根据与甲方签订的服务合同，将公司不具备资源或能力的部分服务（非服务主体）或指定分包部分，由第三方供应商负责提供。并依据与甲方服务合同中所规定的服务内容以及 SLA，启动分包流程。与第三方供应商签订对应服务销售合同。	服务采购合同
--	------------	--------	-----------------	---	--------

3.2 项目实施阶段

项目实施阶段由多个部门、多个岗位分工协作完成，项目经理的职责定位概要如下：

序号	实施内容	责任主体	项目经理职责定位
1	非故障、非巡检	项目经理	根据服务内容和实施计划，协调并组织资源实施
2	驻场管理	人员能力及关怀：技术部 工作内容、服务规范：项目经理	牵头组织驻场工程师编写驻场服务 SOP 驻场服务过程管理
3	应急处理	整体管控和客户关系：项目经理 技术服务：技术负责人 备件：运维管理部	统一调度，统一进展通报； 客户关系处理；

		过程记录和协助监控：运维管理部	
4	阶段及年度总结	项目经理	根据项目管理服务级别组织阶段和年度总结
5	客户档案管理	项目经理	定期更新客户服务档案
6	项目管理活动实施及项目执行管控	项目经理	按照项目管理服务标准实施项目管理活动 以项目计划为基线，整体管控项目执行的过程、结果和客户体验 项目变更管理

下面逐项说明。

3.2.1 非故障、非巡检

项目中非故障、非巡检服务内容繁杂，如预约人天服务，优化服务等；

责任主体：项目经理

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	时限要求	操作规范	参考标准或模板
1	实施计划	购买相关服务内容并指定项目经理的项目	根据合同和与客户约定	在制定整体项目实施计划时，非故障、非巡检服务的实施计划可能无法细化到可操作程度，但在实施前夕，需要细化并与客户确认	
2	实施组织	同上	同上	组织资源实施服务，并负责组成果组织结果验收、交付物审核提交等工作；	

3.2.2 驻场管理

驻场管理包括人员管理和服务管理，人事部主要负责人员管理，运维管理部主要负责服务管理。

人员管理责任主体：人力资源部

服务管理责任主体：运维管理部

项目经理操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	时限要求	操作规范	参考标准或模板
1	驻场服务 SOP 编写及培训	购买相关服务内容并指定项目经理的项目	接到项目交付信息后 10 天之内	在与客户充分沟通的基础上，组织驻场人员编写驻场服务 SOP，并落实对驻场人员的规范培训	驻场服务 SOP 参考模板
2	服务过程管理	同上	同上	1. 每周了解驻场服务情况，及时处理有关服务内容、服务质量、客户关系方面的问题； 2. 人员能力及稳定性方面的问题转区域技术部负责解决； 3. 按照服务计划定期总结沟通。	《项目运维周报》

3.2.3 应急处理

应急处理时，需即刻组成以项目经理为组长的应急小组，各部门密切配合和协作，职责分工如下：

应急小组成员：由各项目技术支持人员，实施人员，客户服务人员组成。具体负责执行项目的应急处理和灾后恢复，制定应急预案方案，应急防范措施，应急处理方案。

组长：项目经理（服务管控及客户关系责任主体）。与技术相关的应急技术负责人参加到应急小组，如应急技术负责人无法应急时，由其上级代为行使职责。主要负责应急方案的审核，应急防范措施的确定，应急处理的实施管控和管理执行，为应急处理的后果和效果负责。

3.2.4 阶段及年度总结

责任主体：项目经理

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	服务级别	操作规范	参考标准或模板
1	阶段总结和年度总结	标准和高级项目管理服务	根据SOW	根据 SOW，按时完成阶段总结报告，精心准备总结会（如有），有目的地组织实施阶段或年度总结。	《阶段/年度总结报告总结报告》

3.2.5 客户档案管理

责任主体：客户档案管理经理及项目经理

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	责任主体	操作规范	参考标准或模板
1	档案管理整体工作管理	标准和高级项目管理服务	客户档案管理专业经理	- 负责客户档案管理工作的规划，实施督导，客户档案价值分析等 - 负责组织客户档案管理工作阶段分析总结	

2	客户服务档案更新	标准和高级项目管理服务	项目经理	根据客户档案管理要求，定期更新项目服务档案	
---	----------	-------------	------	-----------------------	--

3.2.6 项目管理活动实施及项目执行管控

责任主体：项目经理

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	责任主体	操作规范	参考标准或模板
1	标准项目活动（项目经理负责执行的内容）	标准和高级项目管理服务	项目经理	1. 按时、按服务标准要求完成项目启动、计划、总结、客户拜访、节假日安排、客户关怀以及项目沟通等标准项目活动； 2. 及时通报项目活动完成情况及结果	基本、标准及高级项目管理服务产品定义及属性
2	项目执行管控（其他角色负责执行的内容）	标准和高级项目管理服务	项目经理	1. 每天关注项目 case 执行情况，并对是否能达成 SLA 进行评估； 2. 每月根据服务台反馈，关注客户和销售意见，对客户体验进行评估； 3. 每周对项目管理活动进行检查更新，以确保按时、按要求完成； 4. 当发现 SLA 预期不能达成，客户或销售有不满情绪时，应及时采取措施安抚修补。	项目经理周报模板

3.2.7 项目变更管理

责任主体：项目经理

操作规范：

序号	项目管理任务	适用范围	责任主体	操作规范	参考标准或模板
1	项目经理变更	标准和高级项目管理服务		1. 交接发起，项目经理的变更由部门经理发起。在确定侯任项目经理人选后，部门经理发出邮件，要求在任项目经理与后任项目经理在规定时间内完成交接，同时，邮件抄送项目销售 2. 项目经理交接：根据《人员交接规范》完成资料移交、面对面交接、客户现场交接等； 3. 及时通报项目管理活动完成情况及结果	《工作交接管理规范》
2	驻场服务工程师变更	驻场服务项目		1. 交接发起：驻场工程师的变更由项目经理发起。在确定侯任驻场工程师人选后，项目经理发出邮件，要求在任驻场工程师与侯任驻场工程师在规定时间内完成交接，同时，邮件抄送项目销售和部门经理 2. 交接步骤：根据《工作交接管理工作规范》完成资料移交、客户现场报道交接等	《工作交接管理规范》
3	服务内容和成本变更	所有项目		1、 服务变更包括设备变更、服务地点、服务 SLA、服务内容等 2、 对于设备变更，因涉及维保设备型号及序列号等信息变更，同时也会带来服务成本的变更，需要项目经理评估该变更产生的影响并及时通知销售与客户沟通签署变更协议并发起项目交付变更 3、 对于客户服务地点变更，如果在同一个城市客户不同机房只需项目经理内部变更服务地点即可，如果涉及城市变	

				更需要 PM 评估该变更对服务支持能力及实施成本的影响，并及时通知销售做项目交付变更 4、 对用户服务 SLA 的变更，需要项目经理评估 SLA 是调高还是调低，我司 SLA 标准是否能满足客户变更的 SLA，需项目经理提请销售做交付标准变更。 5、 对于用户关于服务内容的变更，需要 PM 分析服务内容变更的影响(具体服务内容变更的情况，是否在服务能力支持范围内，对实施成本有多大影响，现有的服务体系能否满足 SLA 要求等)，并及时将该服务变更通知销售与用户沟通，并做好内部项目交付变更。对于紧急又不在项目交付范围内的服务请求，可以通知销售做单次服务申请技术支持。	
--	--	--	--	---	--

3.3 项目结项阶段

项目结项阶段主要工作规范如下：

序号	项目管理任务	适用范围	责任主体	时限要求	操作规范	参考标准或模板
1	项目内部验收	所有项目	服务台	项目结束前 21 日	1. 由质量管理岗同事对项目进行内部验收，审核项目交付物以及调查客户满意度。 2. 若内部验收不通过，需要项目经理进行整改，整改后再申请内审。 3. 若内部验收通过，执行“项目验收”流程	项目交付物（运维人员工作日志、巡检报告（按需）、调研评估文档、优化改善文档、例行操作文档） 内审报告模板
2	项目验收	所有项目	项目经理	项目结束前 14	1. 向客户提交项目验收申请 2. 客户与运维项目经理共同按照维护项目需	项目验收申请模板 项目验收计划模

				日	求和要求判断是否符合合同条款，是否达到验收指标，最后出具验收报告。	板
3	项目 结项	所有 项目	运维 管理部	/	1. 服务到期前夕，负责组织完成项目总结报告和结项报告，服务期结束后 10 天之内，应向运维管理部提交服务结束确认文件 2. 服务到期前夕，负责与运维管理部、客户沟通确认驻场人员的后续安排问题； 3. 项目结项后，就项目进行小结。回顾并输出经验，形成组织过程遗产。	《项目总结报告》
4	驻场 人员 安排	含驻 场服 务项 目	项目 经理	项目 结束 前 15 日	与运维管理部沟通项目是否续签？ a) 如不续签，驻场人员回到公司报道 b) 续签项目由运维管理部做好预交付或单次申请，并安排驻场人员继续支持	
5	续签 协助	购买 相关 服务 内容 的项 目	项目 经理	项目 结束 前 15 日	1. 项目结束前 15 日邮件通知运维管理部项目到期提醒 2. 协助运维管理部完成项目续签工作	

1.6.1 验收条件

根据合同，运维项目的验收标准为：

1) 运维工作考核，以服务级别是否达成作为依据。

2) 由运维方编制验收文件，完成后送甲方，经审核验收材料符合合同要求，并经甲方同意后由甲方组织进行项目验收。

1.6.2 验收内容

运维项目的验收内容主要包括：

1) 合同约定指标：不同的项目 SLA 会有所不同，根据各项目实际服务级别协议签订情况来验收。

- (1) 项目人员配备是否符合要求；
- (2) 维护人员是否遵守客户方有关的规章制度，服从客户方管理；
- (3) 技术服务要求是否达标；
- (4) 年度维护目标是否达标；
- (5) 系统的运行维护服务报告、服务记录是否完整；

2) 运维工作满意度情况

- (1) 服务内容满意度，包括：服务流程、服务规范性、服务质量、人员技能、服务态度、响应速度、故障解决速度、服务报告、计划执行情况、沟通情况、培训、服务效率；
- (2) 团队情况满意度，包括：技术团队的稳定性、层次化、技术团队的综合能力、技术团队的努力程度和持续改进；
- (3) 服务效果满意度。

3) 日常运维工作的执行情况

- (1) 日常维护（电脑终端、打印机等）公共终端巡检（自助机、大屏等）
- (2) 机房巡检
- (3) 系统软件维护和管理
- (4) 培训服务（包含新职工入职、新上线功能模块）
- (5) 网络管理维护（接入层）
- (6) 数据汇总和统计（经公司审批准许的需求）

4) 运维文档资料

- (1) 运维人员工作日志运维报告
- (2) 巡检报告（按需）
- (3) 调研评估文档
- (4) 优化改善文档
- (5) 例行操作文档

1.6.3 验收人员

1) 用户

- (1) 角色：运维管理部。
- (2) 职责：
 - 负责组织、制定业务系统维护项目的验收和维护工作交付的相关文档的标准和规范；
 - 负责组织项目建设工作验收，对业务系统的项目功能进行验收；
 - 负责审核和批准业务系统验收申请、交付的维护工作成果。

2) 运维项目人员

- (1) 角色：运维项目项目经理。
- (2) 职责：
 - 负责提出维护项目验收申请；
 - 负责执行维护项目验收工作，整理和提交维护工作归档材料，并编写系统运行与维护总结报告。

3.3.1 相关验收文档

项目验收材料清单（包含但不限于）

序号	类型	材料名称	形式
1.	外部客户	运维服务报告	纸质
2.	外部客户	需求递交表	电子
3.	外部客户	优化改善文档	纸质
4.	外部客户	例行操作文档	纸质

序号	类型	材料名称	形式
5.	外部客户	调研评估文档	纸质
6.	内部	服务交付计划	纸质
7.	内部	交付实施记录表	纸质
8.	内部	交付检查计划	纸质
9.	内部	交付检查报告	纸质
10	内部	交付改进计划	纸质
11	内部	交付改进措施表	纸质
